

公司 TODO 管理体系

实施方案

统一在飞书上运行 · 每周一 / 三 / 五 为一个周期 · 以闭环判定交付

2026-08-06

一、方案要解决的问题与总体思路

目标是让全公司的目标与任务在同一个地方可见、可追溯、可验收。现状是这些信息分散在各人的记录与聊天中，管理者无法掌握整体进展，个人也缺少可回溯的工作轨迹。

方案由四件事构成，缺一件则不成闭环：

构成	作用
统一填报入口	全员在同一张共享表格中按固定节奏填写目标与任务，形成唯一的原始事实来源
工作树	按组织层级自动汇总为一棵树，每个节点是一名成员，内含其全部历史记录
分层报表	每位 mentor 获得仅含本人下属的报表；boss 获得全公司汇总
闭环判定	对每条任务判断是否真正完成，未完成项自动带入下一周期

运转方式是「人填报、系统汇总、上级验收」：成员只负责填报与交付，汇总、派发、提醒、归档由系统在固定时间自动完成，验收与评价始终由人做出。

二、角色与职责划分

角色	职责	可见范围
执行人（全体员工）	填报本人清单、按自设时间交付并勾选、登记请假	本人全部记录
mentor（直接上级）	接收下属报表、逐条打分与评语、必要时修改目标	仅本人名下人员
boss（最高层）	不填报、不接收派发，查看全公司汇总与趋势	全公司
系统	定时收集、汇总成树、生成报表、派发待办、判定闭环	—

三种角色：各自的职责与可见范围

原则：填报由本人，验收由上级，汇总与提醒由系统



系统不代替人做判断：目标是否合理、完成是否达标，均由人决定。

图 1 三种角色的职责与可见范围

三、填报内容的结构

清单分三层，自上而下逐层拆解，层与层之间须能对应：

层级	周期	内容要求
大目标	季度 / 半年	须含两项硬性内容：一是与友商的对比（在对标对手面前处于什么位置、要追到哪）；二是具体的外部成果（用户数、收入、签约等可量化的对外结果）。数量一至两个为宜
小目标	两至三周	把大目标拆成能看到结果的一段，有明确截止日；每个应能回答「完成后大目标前进多少」
TODO	每几天	具体事项。每条必须写明三项：做什么（交付物）、截止日期（本人自定）、验收人（通常为本人 mentor）

两项硬性要求的用意：没有友商对比，无法判断做得是否足够；没有外部成果，容易把投入当成产出。支撑类岗位可写所支撑业务线的外部成果并说明本人环节，口径由 mentor 确认。

截止日期由执行人自定，而非上级指派——因此它同时是逾期判定的依据。

四、周期运转时间表

每周一、三、五各运转一轮，三天的流程完全相同：

时间	执行方	动作
上午（自行安排）	执行人	更新本人清单：大目标 / 小目标 / TODO
14:50	系统	向尚未填报的成员发送提醒
15:00	系统	读取表格，更新工作树，生成各团队报表
15:05	系统	向各 mentor 推送报表，向各执行人派发待办任务
此后	执行人	按自设截止时间完成、勾选并附上成果
交付后	mentor	对该条打分（1-5）并写评语，或打回重做
次日上午	系统	判定闭环；未闭环项带逾期天数进入下一周期

唯一的硬性时间点是「下午三点前完成填报」，此后各环节均由系统发起。

一个周期的时间表（以周一为例，周三、周五相同）



唯一的硬性时间点是「下午三点前完成填报」。此后各环节由系统发起，成员只需处理收到的待办。

图 2 单个周期的时间安排


五、工作树：汇总结构

填报内容按组织层级自动汇总成一棵树：最上层为 boss，向下为各项目负责人，再向下为项目内的每位成员。每个节点对应一名成员，节点内容是该成员按时间排列的全部填报记录与评价。

规则	含义	作用
只累加，不覆盖	每一周期的内容向后追加，此前记录永久保留	可回溯当初设定的目标及其演变过程，为复盘与评估提供直接材料
随时可修改	目标不合适时，本人与 mentor 均可直接调整	不必等到下一周期；修改后的版本作为新记录留存

工作树：一张组织图，每个节点挂着该成员的完整记录

自 boss 向下延伸至项目负责人，再到项目内的每一位成员

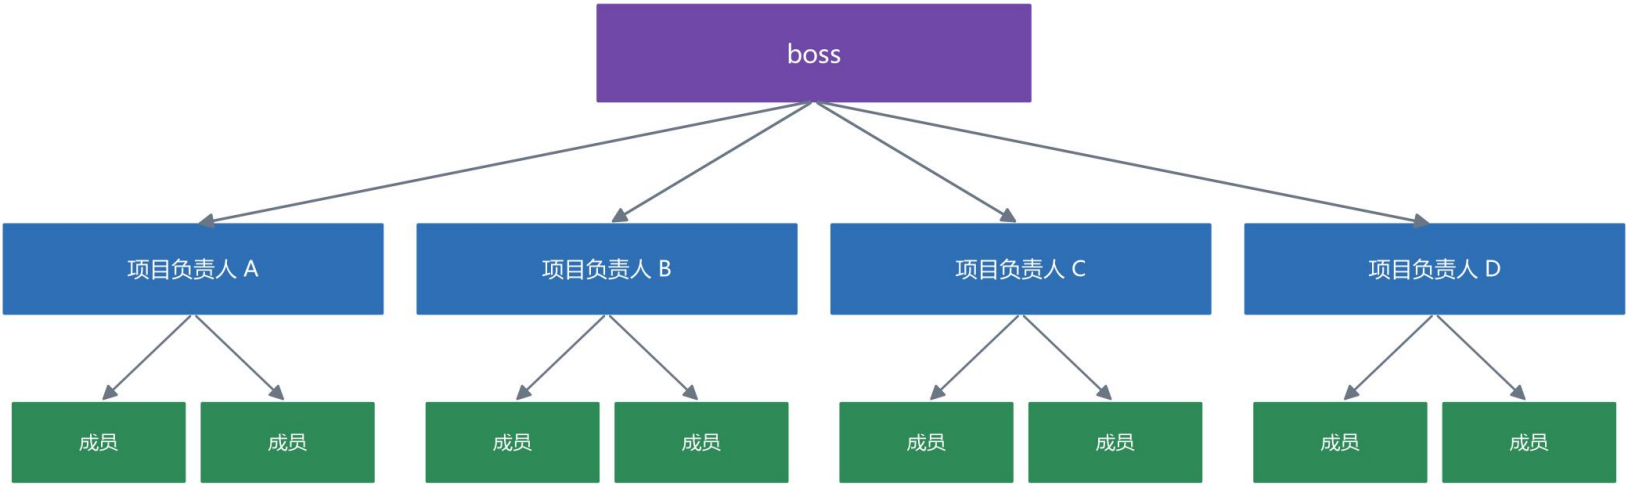

展开任一节点，内容是该成员按时间排列的记录：

- 8月4日 (周一)

大目标：Q3 日活追平友商 A（截止 9/30） · 小目标：改版注册流程（截止 8/15）
TODO：完成注册页原型 —— 验收人 李四 —— 截止 8/6
- 8月6日 (周三)

上级评价：4 分，原型可用，但缺少异常态说明，下轮补上
- 8月6日 (周三)

本次新增 TODO：补异常态说明 —— 验收人 李四 —— 截止 8/8
- ↑ 新内容向下追加，旧内容永久保留，可随时回看原始目标

图 3 工作树结构与节点内容示例

六、报表与派发

6.1 报表分发原则

每位 mentor 在周期时点收到一份独立报表，内容仅含本人名下人员。报表包含：

栏目	内容
人员概况	本周期填报人数、请假人数、未按时填报人数
目标数量	大目标 / 小目标 / 本周期 TODO 各多少条
完成情况	已闭环、进行中、逾期各多少条
逾期明细	逐条列出责任人、原定截止日、已逾期天数
请假标注	请假人员单列，其任务截止日已顺延，不计逾期
评价概况	本周期评分分布与平均分
趋势	近几个周期完成率的变化

可见范围通过独立的报表与文件权限实现，而非视图筛选：

- 每位 mentor 对应一份独立报表，只包含本人下属。
- mentor 之间互不可见；报表由系统直接投递给对应 mentor，不经群组转发。
- boss 另收一份全公司汇总，可查看任意成员的历史记录。

6.2 任务派发

执行人填写的每条 TODO 会作为一条可勾选的待办派发给本人。派发对象是该条 TODO 的填写者本人，验收对象是其指定的验收人。完成后勾选即视为提交，系统自动通知验收人。

七、请假的处理

请假在同一张表格中设专门的「请假表」登记，填写姓名、开始日期、结束日期、类型（事假 / 病假 / 年假 / 出差），本人填写或 mentor 代填均可。系统据此在派发前判定，分三种情形：

情形	任务处理	报表呈现
整周期请假	不派发任务、不建待办	整块标注「请假」，不计入逾期
部分日期请假	照常派发，截止日顺延请假天数	标注「截止顺延 N 天」
请假期间已交付	不作特殊处理，按实际情况计	不标注请假

请假必须经登记确认，系统不从打卡记录推断。原因是缺卡同时对应出差、外勤与漏打卡，推断出错的方向恰好是少计逾期，此类偏差不会被察觉，等于考核失效。因此漏登记时先按逾期记录，由本人说明后撤销。

八、交付、评价与闭环判定

8.1 评价机制

交付后由验收人（通常为 mentor）给出 1-5 分与评语，或选择打回重做。评价随即写入该成员工作树中对应任务之后。

分数	含义
5 / 4 分	按期完成，成果可用；5 分为超出预期
3 分	基本完成，需补充或部分返工
2 / 1 分	延期或成果明显不足；1 分为未交付或与要求不符
打回重做	不给分，退回继续处理，该条保持未闭环

系统会依据是否按期、是否一次通过、成果是否齐备给出一个参考分，仅作参考；最终以 mentor 的评分为准，两者不一致时按 mentor 的结果记录。

8.2 闭环五个条件

一条任务须同时满足下列五项才判定为闭环，缺任一项即停留在未闭环状态：

#	条件
1	已指定验收人
2	已设定截止时间，且已到期或提前完成
3	执行人已勾选并提交成果
4	验收人已给出分数与评语
5	评价已写入该成员工作树中该条任务之后

关键区别：勾选完成只满足第 3 项。「本人认为做完」与「该项已闭环」是两个状态，中间隔着验收环节。


8.3 未闭环项的回流

- 未闭环项不会被清除，而是带着原定截止日与已逾期天数进入下一周期的清单。
- 请假顺延项同样回流——顺延是时间后移，不是取消。
- 逾期天数持续累加至闭环为止，并在 mentor 报表中单列。

- 确实不再需要做的事情，应由本人与 mentor 商定后从目标中移除，而非长期挂为逾期。

TODO 管理闭环流程图

每周一 / 三 / 五 下午三点转一圈 · 七个环节 · 只有走完整圈，一件事才算真的做完

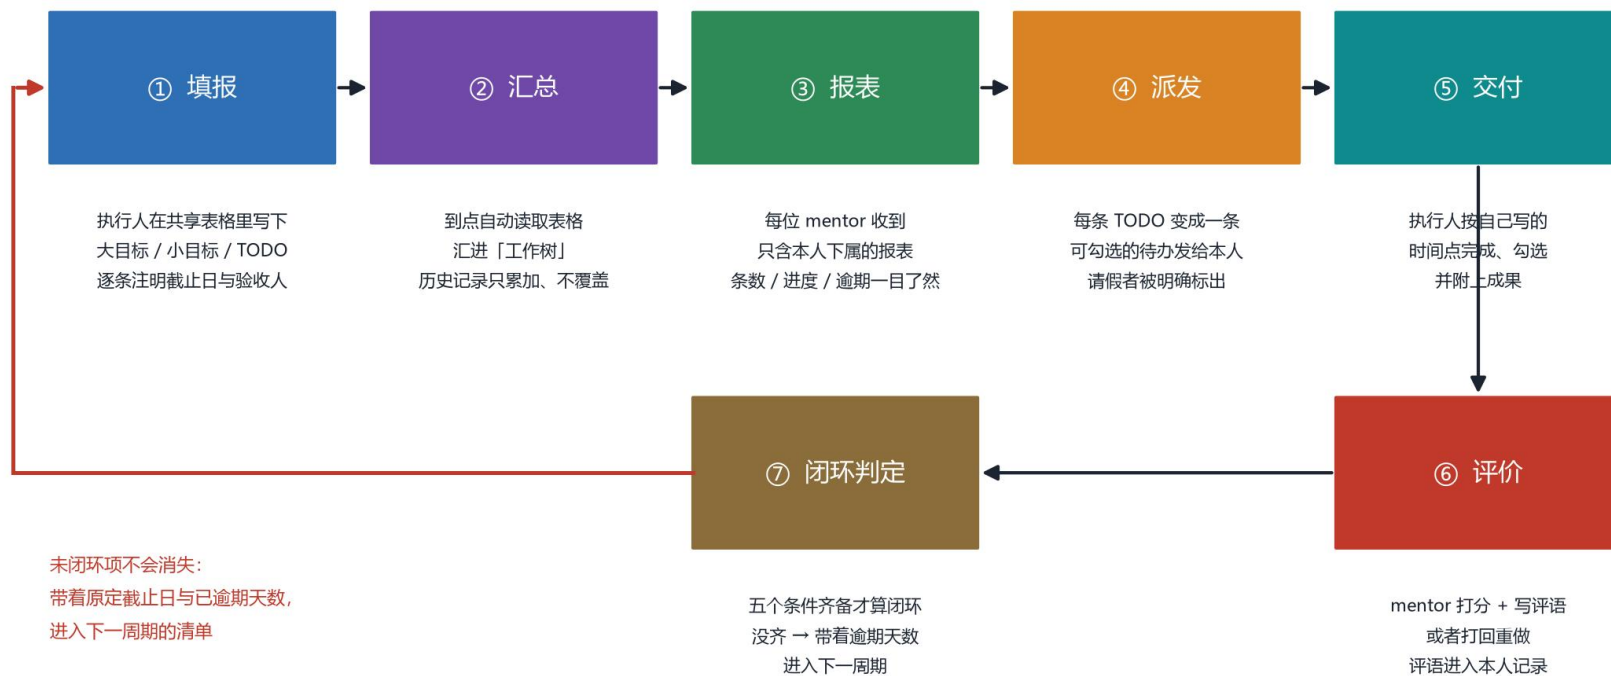

环节归属：① ④ ⑤ 执行人 · ③ ⑥ mentor · ② ⑦ 系统自动完成

图 4 完整闭环流程与未闭环项的回流路径

九、实施步骤

阶段	内容	完成标志
一、搭建	建立共享表格（含请假表）、工作树骨架与各 mentor 报表	任一成员的填报能出现在其节点与所属 mentor 报表中
二、试运行	选一个团队（一位 mentor + 3-5 人）跑满一个周期	填写口径、请假登记、打分习惯三项磨合完成
三、全员推行	各团队依次接入，接入时做一次半小时说明	全员按节奏填报，报表按时产出

试运行不建议省略：填写口径、请假登记与评分尺度这三件事最容易返工，在小范围内确认后再推广，成本远低于全员返工。

方案的三个要点：

- 填报节奏固定：每周一、三、五下午三点前，每条任务注明截止日与验收人。
- 记录只累加不覆盖，且随时可改——既可追溯，也不锁死目标。
- 以闭环为交付标准：五个条件齐备才算完成，未闭环项自动回流。
